


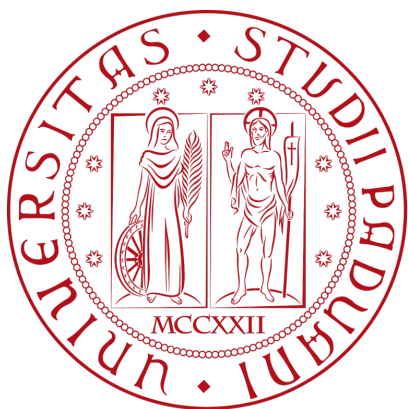

Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Verbale riunione

2025-12-23

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Autori	Aldo Bettega
Verificatori	Felician Mario Necsulescu
Uso	Interno
Destinatari	Tutto il gruppo

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-12-24	Aldo Bettega	Aldo Bettega	Approvazione
0.1.0	2025-12-23	Aldo Bettega	Felician Mario Necsulescu	Stesura del verbale

Indice

1) Informazioni generali	1
2) Ordine del giorno	2
3) Riassunto della riunione	3
4) Retrospettiva	3
5) Argomenti principali	3
5.1) Glossario	3
5.2) Difficoltà nei preventivi	4
5.3) Scelte tecnologiche nel Piano di Qualifica	4
6) Decisioni	5
7) TODO	6

1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione fine sprint
- **Data:** 2025-12-23
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 15:30
- **Ora fine:** 16:30
- **Scriba:** Aldo Bettega
- **Partecipanti:**
 - Filippo Guerra
 - Davide Lorenzon
 - Ana Maria Draghici
 - Aldo Bettega
 - Davide Testolin
 - Felician Mario Necsulescu

2) Ordine del giorno

- Retrospectiva

3) Riassunto della riunione

La riunione di fine sprint ha riguardato principalmente:

- Retrospettiva dello sprint
- Aspetti tecnici della repo e del sito web (gestione cartelle e glossario)
- Discussione sulle difficoltà incontrate nella progettazione del preventivo, data l'inesperienza dei membri del gruppo
- Discussione su come avanzare verso il PoC e iniziare a studiare proposte di tecnologie per lo sviluppo del prodotto
- Decisione condivisa di considerare il periodo di vacanze come pausa, senza rotazione dei ruoli e avanzamento dello sprint

4) Retrospettiva

1. Glossario web: aggiornamento dello script.
2. Use case: completati al 90%, raggiunta maturità di struttura e contenuti.
3. Requisiti: struttura generale definita, da concludere; Analisi dei requisiti quasi conclusa.
4. Piano di qualifica: prima stesura presente, inserita sezione sull'indice di Gulpease con appendice conclusiva.
5. Piano di progetto / preventivo: avviata ricerca sulle tecniche di stima, difficoltà causate dall'inesperienza che deve essere messa in considerazione e dichiarata.
6. Retrospettiva di sprint:
 - Cosa ha funzionato:
 - studio dei documenti condiviso tramite riassunti.
 - Proposte di miglioramento:
 - ricerca a coppie su temi complessi;
 - migliore pianificazione basata sugli errori degli sprint precedenti;
 - esplicitare azioni concrete per gli sprint successivi.
7. Organizzazione e sprint: vacanze considerate come periodo di pausa, nessuna rotazione dei ruoli ed eventuale lavoro prodotto slitterà allo sprint successivo.

5) Argomenti principali

5.1) Glossario

Durante la riunione si è discusso dell'aggiornamento del glossario web e dello script Python utilizzato per la sua generazione. In particolare è emersa la necessità di estendere lo script esistente, già utilizzato in precedenza, per includere anche la gestione delle abbreviazioni. La modifica è stata ritenuta semplice e a basso impatto. Parallelamente si è affrontato il tema dell'organizzazione del repository e della struttura del sito web, valutando la possibilità di spostare tutti i file HTML all'interno della cartella docs, sfruttando le impostazioni offerte da GitHub Pages. È stato chiarito che questa soluzione permette di mantenere il repository più ordinato senza compromettere il funzionamento del sito. Si è quindi deciso di procedere con lo spostamento dei file del sito nella cartella docs e di adattare di conseguenza i path di input e output dello script di generazione del glossario, senza intervenire sui PDF salvo eventuali problemi futuri.

5.2) Difficoltà nei preventivi

Una parte significativa della riunione è stata dedicata alle difficoltà incontrate nella definizione dei preventivi e delle stime temporali. È emerso che molte delle tecniche di preventivo analizzate si basano fortemente sull'esperienza pregressa e su dati storici, elementi che il gruppo non possiede in questa fase del progetto. Questo rende complessa l'applicazione rigorosa di tali tecniche e aumenta il rischio di effettuare stime basate esclusivamente su sensazioni soggettive. Si è quindi chiarito che l'inesperienza del team deve essere considerata e dichiarata esplicitamente all'interno della documentazione. Nonostante ciò, si è deciso di adottare comunque una tecnica di stima, anche se approssimativa, al fine di dimostrare un approccio metodologico consapevole. Inoltre, è stato sottolineato che la retrospettiva non deve limitarsi all'analisi di ciò che è andato bene o male, ma deve includere anche una revisione del piano futuro, con un ricalcolo delle ore e delle attività sulla base dell'esperienza maturata negli sprint precedenti, in linea con le indicazioni fornite dal docente.

5.3) Scelte tecnologiche nel Piano di Qualifica

La discussione sulle scelte tecnologiche del Piano di Qualifica ha avuto carattere di brainstorming preliminare, senza portare a decisioni definitive. Sono state considerate in modo generale alcune possibili soluzioni, come un approccio web-based e l'uso del pattern Model-View-Controller, riconoscendo però la necessità di uno studio più approfondito per individuare le tecnologie più adatte al progetto.

Separatamente, si è discusso dell'indice di Gulpease, per il quale è stato deciso di definire chiaramente le modalità di applicazione. Il Piano di Qualifica includerà una sezione dedicata e un'appendice che ne descriva l'utilizzo concreto nel contesto del progetto, al fine di rendere il processo di valutazione esplicito e verificabile.

6) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.11.1	Aggiornamento dello script Python per la generazione del glossario web	Necessità di includere le abbreviazioni e adattare i path dopo la riorganizzazione del sito	Riunione fine sprint
VI.11.2	Spostamento dei file del sito web nella cartella docs del repository	Migliorare l'ordine del repository sfruttando la configurazione di GitHub Pages	Riunione fine sprint
VI.11.3	Trattare le scelte tecnologiche del PoC come brainstorming preliminare	Mancanza di una valutazione approfondita delle tecnologie e necessità di studio ulteriore	Riunione fine sprint
VI.11.4	Definire esplicitamente l'applicazione dell'indice di Gulpease nel Piano di Qualifica	Rendere trasparente e verificabile l'uso delle metriche di leggibilità	Riunione fine sprint
VI.11.5	Adottare una tecnica di preventivo dichiarando l'inesperienza del team	Dimostrare un approccio metodologico pur in assenza di dati storici	Riunione fine sprint

7) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

Codice	Assegnatari	Task	Decisione di riferimento
TD.14.1	Aldo Bettega	Stesura di questo verbale	-
TD.14.2	Filippo Guerra	Aggiornare lo script Python del glossario includendo abbreviazioni e nuovi path	VI.11.1
TD.14.3	Davide Testolin	Spostare i file HTML del sito nella cartella docs e verificare il corretto funzionamento dei link	VI.11.2
TD.14.4	Tutto il gruppo	Studiare e valutare le tecnologie più adatte da adottare nel Piano di Qualifica	VI.11.3
TD.14.5	Davide Lorenzon	Completare la sezione sull'indice di Gulpease e l'appendice applicativa	VI.11.4
TD.14.6	Davide Testolin	Definire una tecnica di preventivo e aggiornare il piano nelle retrospettive future	VI.11.5
TD.14.7	Davide Testolin, Filippo Guerra	Iniziare a definire la struttura logica dei JSON per i decision tree	Decisione su scelte tecnologiche PoC
